



# Информация о выполнении рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

Мария Шулежко, главный контролер,  
Счетная палата Украины

III заседание Специальной группы EUROSAI  
22–23 марта 2011 года,  
Москва, Российская Федерация

- ▶ **Общий отчет по результатам Международного координированного аудита Чернобыльского фонда „Укрытие” был подписан 03.06.2008 на VII Конгрессе EUROSАI в г. Кракове (Польша) руководителями высших органов финансового контроля (ВОФК) Украины, Федеральной Республики Германия, Швейцарской Конфедерации, Республики Польша, Российской Федерации, Словацкой Республики и Европейского суда аудиторов**

- ▶ Целью аудита была оценка состояния обеспечения превращения объекта „Укрытие” на Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему путем внедрения Плана осуществления мероприятий на объекте „Укрытие” (проект Shelter Implementation – SIP), принятого Правительствами стран Большой Семерки и Украины, финансирование которого осуществляется за счет средств Чернобыльского фонда „Укрытие”

- ▶ С целью не допущения снижения состояния безопасности объекта „Укрытие”, поддержания его в эксплуатационном состоянии и обеспечения выполнения Плана осуществления мероприятий (Shelter Implementation – SIP) по результатам аудита были предоставлены рекомендации
  - Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда „Укрытие
  - Правительствам стран–вкладчиков
  - Правительству Украины

- ▶ Ассамблеей доноров Чернобыльского фонда „Укрытие”, Европейским банком реконструкции и развития, Правительствами стран–вкладчиков (доноров) фонда, в частности стран, высшие органы финансового контроля которых брали участие в проведении аудита, рассмотрены общие рекомендации Международного координированного аудита Чернобыльского фонда „Укрытие” отдельные из которых за период 2008–2010 годов реализованы

## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

Результаты реагирования:

- ▶ Активизировалась работа по наполнению средствами Чернобыльского фонда „Укрытие”
- ▶ Достигнуты договоренности о необходимости утверждения четких графиков реализации всех проектов на площадке Чернобыльской АЭС
- ▶ Определена оптимизированная оценка стоимости реализации проектов
- ▶ Продолжается поэтапная передача полномочий
- ▶ Создано Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и назначено его Председателя


## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

Нерешенные вопросы:

- ▶ Приведение организационной структуры Группы управления проектом в соответствие с предложениями управленческого аудита
- ▶ Оптимизация администрирования Чернобыльского фонда „Укрытие” и Счета ядерной безопасности путем объединения Групп управления проектами
- ▶ Своевременное введение в эксплуатацию отдельных объектов инфраструктуры

# Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

## Состав и структура взносов в Чернобыльский фонд „Укрытие” (по состоянию на 01.10.2010 в млн. евро)

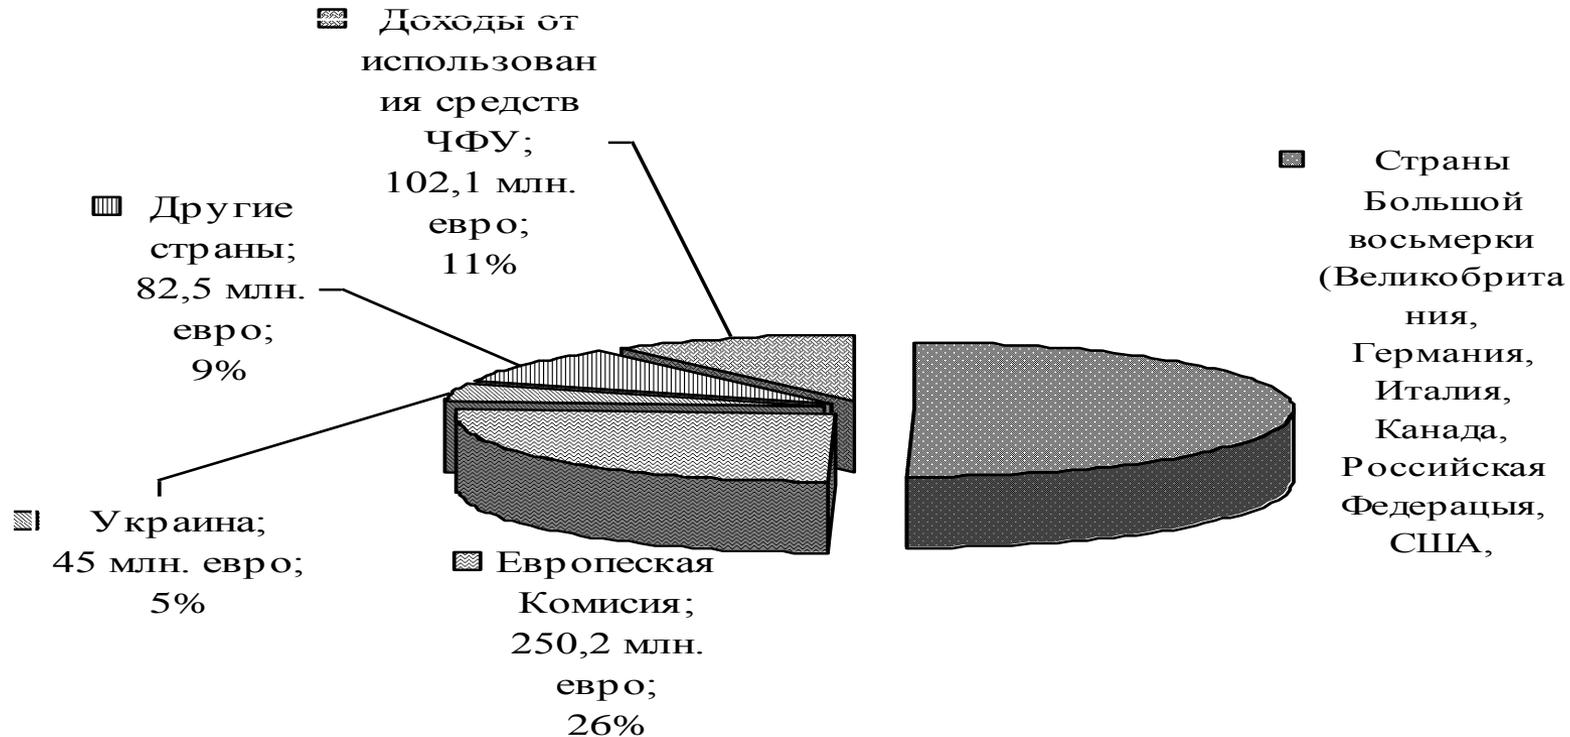

## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

- ▶ Доходная часть Чернобыльского фонда „Укрытие” составляет 966,1 млн. евро, и для обеспечения выполнения работ по превращению объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему необходимо дополнительные средства в сумме около 600 млн. евро.

- ▶ Объект инфраструктуры, который является необходимым условием снятия с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС и хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-1, ХОЯТ-2 (начальный срок сдачи в эксплуатацию март 2003 г.), осуществляется с задержкой более чем на 10 лет

## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

- ▶ Завершение строительства завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) предусматривается не раньше 2011 года
- ▶ Строительство промышленного комплекса обращения с твердыми радиоактивными отходами (ПКОТРО), осуществляется с задержкой почти на 6 лет

## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

- ▶ Существуют риски по перенесению сроков завершения выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличение их стоимости

- ▶ Международный координированный аудит Чернобыльского фонда „Укрытие” привлек внимание международного сообщества к нерешенным проблемам, порожденным наибольшей техногенной катастрофой, которая состоялась четверть столетия назад, вопрос относительно выполнения его рекомендаций, как на международном, так и национальном уровне, является по-прежнему актуальным

## Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

- ▶ Основное предложение – продолжить мониторинг выполнения рекомендаций Международного координированного аудита Чернобыльского фонда „Укрытие” до полного завершения работ на объекте „Укрытие” и превращения его в экологически безопасную систему

# Выполнение рекомендаций международного координированного аудита Чернобыльского фонда «Укрытие»

Спасибо за внимание!
